

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 708/01
Zo dňa: 11.03.2014

Počet výtlačkov: 2
Výtlačok číslo: 1
Počet strán: 13
Počet príloh: 1



PROTOKOL

**o výsledku kontroly
čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní
pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí Slovenskej republiky**

Obec Horné Srnie

Trenčín august 2014

Zhrnutie

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v obci Horné Srnie bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na rok 2014.

Úvodný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky bol financovaný z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky, na prvý a aj na druhý realizačný projekt bola v rozpočtovej kapitole Úradu vlády Slovenskej republiky vyčlenená rezerva finančných prostriedkov.

Obec Horné Srnie bola zaradená do druhého realizačného projektu programu revitalizácie krajiny. Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky uzatvorenej s Úradom vlády Slovenskej republiky boli obci poskytnuté finančné prostriedky v sume 20 000,00 eur. Obec sa zaviazala použiť tieto finančné prostriedky na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu.

Cieľom projektu bolo eliminovať škody najmä pri extrémnych zrážkach a pri topení snehu vybudovaním odrážok a vodozádržných opatrení, ktoré by podstatne znížili prítok vody do obce, zabránili poškodzovaniu poľných ciest, erózii a v konečnom dôsledku aj zaplavovaniu zastavanej časti obce. V projektovej dokumentácii bol plánovaný celkový zádržný objem pre navrhované opatrenia 10 140 m³. Podľa ukončených prác bol tento objem navýšený na 11 032,2 m³. Zrealizovaných bolo spolu 67 vodozádržných zariadení.

Kontrolou bolo zistené, že obec skutočne vyčerpala finančné prostriedky v sume 19 043,37 eur, uznané čerpanie finančných prostriedkov poskytovateľom bolo v sume 18 728,15 eur a nevyčerpané prostriedky v sume 956,63 eur boli vrátené na účet Úradu vlády Slovenskej republiky. Po uznaní a odsúhlasení výdavkov bola na účet poskytovateľa vrátená ešte suma 315,22 eur, pričom výnosy nevznikli žiadne.

Kontrola preukázala porušenie zákona o účtovníctve, keď faktúra na vyhotovenie projektovej dokumentácie bola zaúčtovaná s nesprávne uvedeným účastníkom konania a keď k dvom dodávateľským faktúram na vykonanie prác v súvislosti s projektom neboli priložené súpisy vykonaných prác, čím uvedené účtovné doklady neboli preukázateľné.

Porušenie Zákonníka práce bolo preukázané, keď v piatich pracovných zmluvách so zamestnancami nebol uvedený údaj o tom, kto pri uzatváraní konal v mene zamestnávateľa.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite bol porušený, keď v súvislosti s uzatvorením piatich pracovných zmlúv, jednej zmluvy o dielo, pri jednej objednávke a šiestich výdavkových pokladničných dokladoch nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola. Zároveň v súvislosti s uhradením dvoch faktúr pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly bol uvedený len dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala predbežnú finančnú kontrolu a nebolo uvedené, či pripravovaná finančná operácia bola alebo nebola v súlade s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, internými aktmi riadenia.

Ďalej bolo zistené porušenie zmluvy, keď nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet poskytovateľa po zmluvne stanovenom termíne, čím bola porušená finančná disciplína. Zároveň bolo zistené, že finančné prostriedky boli vyúčtované po zmluvne stanovenom termíne.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Stavebný zákon bol porušený, keď revitalizačné protipovodňové opatrenia boli vybudované bez vydania rozhodnutia o využití územia.

Kontrolou na mieste realizácie projektu bolo zistené, že vybrané vybudované vodozádržné opatrenia boli udržiavané, plne funkčné a plnili svoj účel.

**Protokol
o výsledku kontroly**

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 708/01 z 11.03.2014 vykonali:

Ing. Katarína Kuciaková – vedúca kontrolnej skupiny
Ing. Miloš Tomka – člen kontrolnej skupiny

kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorej účelom bolo preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky.

Kontrola bola vykonaná v čase od 12.05.2014 do 30.07.2014 v kontrolovanom subjekte

**Obec Horné Srnie
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
IČO 00311588**

za kontrolované obdobie: doba realizácie projektu (2011, 2012) a súvisiace obdobie.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií.

Predmetom kontroly bolo:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu
 - charakteristika kontrolovaného subjektu so zameraním na činnosti vo vzťahu k prijatým finančným prostriedkom, charakteristika realizačného projektu a jeho financovania, vykonanie kontroly plnenia zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.
2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov
 - preverenie oprávnenosti, hospodárnosti, preukázateľnosti a účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov, obstaranie tovaru, prác a služieb, správnosť vyúčtovania použitých finančných prostriedkov.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu a financovaného realizačného projektu

- **Charakteristika kontrolovaného subjektu so zameraním na činnosti vo vzťahu k prijatým finančným prostriedkom**

Obec Horné Srnie (ďalej len „obec“) bola v zmysle ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Obec bola právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a schválenými všeobecne záväznými nariadeniami obce. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy bola starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

- **Charakteristika realizačného projektu a jeho financovania**

Kontrolovaný subjekt mal na realizáciu vodozádržných opatrení vypracovaný projekt. Cieľom projektu bolo eliminovať škody na zdraví a majetku v katastrálnom území obce. Celkovo bolo plánované vybudovať 10 140 m³ vodozádržných systémov protipovodňovými objektmi v katastrálnom území obce a to hlavne prehrádzky a odrážky. Vodozádržné opatrenia boli navrhnuté v lokalitách Lány – Dolný Kopár, Dúbrava, Sráz – Urbárska skládka, Vršok, Záhradkárska oblasť – Horný potok. Vodozádržné opatrenia by mali podporiť akumuláciu a infiltráciu vody v krajine a spomalenie odtoku vody.

Rozpočet a financovanie projektu: Projekt bol financovaný z Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad vlády SR“ alebo „poskytovateľ“). Výdavky určené na bežné výdavky obce boli schválené v stanovenom štruktúrovanom rozpočte projektu.

Štruktúrovaný rozpočet projektu:

Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eur	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eur
1. Osobné výdavky, mzdové náklady (celková cena práce)				
5% spolufinancovanie na 10 prac. miest podľa § 50j	osoba/mesiac	25,70	60	1 542,00
celkom				1 542,00
2. Cestovné výdavky a cestovné náklady				
celkom				0,00
3. Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu				
výkopy	m 3	9	45	405,00
prehrádzky do 1 m - drevo	m 3	0	0	0
prehrádzky do 2 m - drevo	m 3	50	176	8 800,00
odrážky - drevo	m 3	0	0	0
spojovací materiál	kg	35	55	1 925,00
celkom				11 130,00

4. Výdavky na služby				
technické a poradenské služby zabezpečované dodávateľsky napr.				
vodný majster	osoba/mesiac	900	6	5 400,00
projektová dokumentácia	ks	1	1500	1 500,00
GPS zameranie	ks	1	300	300,00
posudok, konzultácia geológ	ks, hod.	0	0	0
školenie vodného majstra	hod.	0	0	0
celkom				7 200,00
5. Iné oprávnené výdavky				
ostatné náklady súvisiace so zamestnaním uchádzačov:				
poistenie zamestnancov	osoba	5	10	50,00
vstupná zdravotná prehliadka	osoba	5	10	50,00
ochranné pracovné prostriedky	osoba	0	0	0
mapové podklady, geometrické plány, identifikácia parciel a pod.	projekt	28	1	28,00
strava – občerstvenie pre zamestnancov (novovytvorené miesta)	osoba/mesiac	0	0	0
školenie zamestnancov (novovytvorené miesta) – ak ich nevyškolí zhotoviteľ	hod.	0	0	0
celkom				128,00
Spolu (bežné výdavky)				20 000,00

Obec bola zaradená do druhého realizačného projektu programu revitalizácie krajiny na základe odoslaného elektronického prihlasovacieho formulára.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) bola uzatvorená 25.11.2011 medzi prijímateľom obcou a poskytovateľom Úradom vlády SR.

Predmetom zmluvy bol záväzok poskytovateľa poskytnúť obci finančné prostriedky v sume 20 000,00 eur a záväzok obce použiť tieto finančné prostriedky na bežné výdavky v termíne do 31.03.2012 s účelovým určením na realizáciu projektu „Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011“ v zmysle štruktúrovaného rozpočtu, ktorý tvoril prílohu zmluvy.

Kontrolou zmluvy, jej platnosti, účinnosti a zverejnenia neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Vykonanie kontroly plnenia zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov**

Kontrolou bolo zistené, že v súvislosti s realizovaným projektom nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany poskytovateľa.

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri použití verejných prostriedkov

- **Preverenie oprávnenosti, hospodárnosti, preukázateľnosti a účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov**

Obec mala v štruktúrovanom rozpočte projektu vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie 10 pracovných miest. Kontrolou bolo zistené, že do projektu bolo zapojených len päť zamestnancov na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „dohoda“) s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Na základe predložených žiadostí o platbu boli refundované náklady na mzdy zamestnancov a to 95 % z celkovej ceny práce a časť nákladov na materiál a náradie za obdobie realizácie projektu v zmysle uzatvorenej dohody.

Vodozádržné opatrenia boli vykonávané na pozemkoch, ktoré mala obec vo svojom vlastníctve a na pozemkoch vo vlastníctve miestneho urbárskeho spoločenstva, s jeho písomným súhlasom.

Kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených vodozádržných opatrení vykonávala obec sporadicky raz za mesiac pracovníkmi na aktívnych prácach resp. zamestnancami obce.

Kontrolná skupina skontrolovala všetky účtovné doklady súvisiace s projektom. Kontrolou účtovných dokladov boli zistené nasledovné nedostatky:

- Kontrolou náležitostí faktúry na vyhotovenie projektovej dokumentácie bolo zistené, že obec zaúčtovala faktúru s nesprávne uvedeným účastníkom konania, čo bolo v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý obsahuje označenie účastníkov konania, ktorým v tomto prípade mala byť obec ako právny subjekt a nie obecný úrad.

- Ďalej bolo zistené, že k dvom dodávateľským faktúram na vykonanie prác v súvislosti s projektom neboli priložené zápisy vykonaných prác, čím uvedené účtovné doklady neboli preukázateľné a tým nebolo dodržané ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a zároveň aj ustanovenie § 32 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných dokladov.

- Kontrola preukázala, že pri piatich pracovných zmluvách uzatvorených v súvislosti s projektom nebol uvedený údaj o tom, kto pri uzatváraní konal v mene zamestnávateľa. V pracovných zmluvách bol uvedený ako zamestnávateľ iba obec bez uvedenia (mena a priezviska) štatutárneho orgánu zamestnávateľa, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), podľa ktorého v pracovnoprávných vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán.

○ Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že v súvislosti s uzatvorením piatich pracovných zmlúv, jednej zmluvy o dielo, pri jednej objednávke a šiestich výdavkových pokladničných dokladoch nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola, čím nebolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“), podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu. Finančnou operáciou je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. j) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.

○ Ďalej bolo zistené, že v súvislosti s uhradením dvoch faktúr bol pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly uvedený len dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala predbežnú finančnú kontrolu a nebolo uvedené, či pripravovaná finančná operácia bola alebo nebola v súlade s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, internými aktmi riadenia, a tým nebolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou okrem iného aj vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia bola alebo nebola v súlade s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, internými aktmi riadenia.

Kontrolná skupina vykonala fyzickú kontrolu vybraných zrealizovaných vodozádržných opatrení. Kontrolou bolo zistené, že vybudované vodozádržné opatrenia boli udržiavané, plne funkčné a plnili svoj účel. Fotodokumentácia vybraných zrealizovaných vodozádržných opatrení tvorí Prílohu č. 1 tohto protokolu o výsledku kontroly.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že účel použitia prostriedkov bol dodržaný, pri použití finančných prostriedkov bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov. Kontrola preukázala, že finančné prostriedky boli použité v zmluvne stanovenom termíne.

Obec vybuďovala revitalizačné protipovodňové opatrenia bez toho, aby požiadala príslušný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o využití územia, čo bolo v rozpore s ustanovením § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon“), podľa ktorého umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o využití územia.

• **Obstaranie tovaru, prác a služieb**

Kontrolnej skupine bol predložený záznam z prieskumu trhu, ktorým obec deklarovala výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu vodozádržných opatrení. Výber dodávateľa obec vykonala podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec na predloženie ponuky vyzvala tri firmy. Všetky vyzvané firmy predložili ponuku a obec vybrala ponuku s najnižšou cenou. S vybraným uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo.

- **Správnosť vyúčtovania použitých finančných prostriedkov**

Obec predložila ku kontrole záverečnú správu, ktorou dokladovala finančné vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov vo väzbe na zmluvné podmienky. Podľa bodu 5 zmluvných podmienok malo vyúčtovanie obsahovať:

a) Záverečnú správu o realizácii projektu, z ktorej malo byť zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. I. Jej súčasťou malo byť prehľadné vyhotovenie dokumentácie o realizácii projektu, vyhodnotenie projektu a vecným popisom realizácie projektu (napr. lokalizáciu vrátane parcelného čísla pozemku, typ úpravy a opatrenia a pod.) s fotodokumentáciou pred a po ukončení realizácie projektu.

Kontrolná skupina zistila, že boli zrealizované všetky naprojektované protipovodňové opatrenia. Cieľom realizácie bola revitalizácia krajiny s cieľom zníženia povodňových rizík, zmiernenie dopadov prívateľných dažďov a lokálnych záplav. Parametre projektu boli dosiahnuté nasledovne:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie mal byť dosiahnutý zadržaný objem 10 140 m³. Tento mal byť dosiahnutý vybudovaním 34 drevených odrážok, piatich oceľových odrážok, 11 prehrádzok, piatich rigolov, 11 prejazdnych rigolov a jednej retenčnej nádrže. Podľa záverečnej správy bolo vybudovaných všetkých 67 vodozádržných zariadení s celkovým vodozádržným objemom 11 032,2 m³.

Z vyššie uvedeného vyplynulo, že kontrolovaný subjekt realizáciou vodozádržných opatrení zabezpečil dosiahnutie určených parametrov projektu.

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole Záverečnú správu z vyúčtovania finančných prostriedkov. V tejto správe bolo uvedené, že „cieľom projektu bolo eliminovať škody najmä pri extrémnych zrážkach a pri topení snehu vybudovaním odrážok a vodozádržných opatrení, ktoré podstatne znížia prítok vody do obce, zabrániť poškodzovaniu poľných ciest, erózii a v konečnom dôsledku aj zaplavovaniu zastavanej časti obce.“ Správa tiež obsahovala fotodokumentáciu z predmetných lokalít pred ako aj po realizácii opatrení. Boli predložené satelitné snímky z komerčného programu so znázornením rozmiestnenia jednotlivých vodozádržných objektov.

b) Finančné vyúčtovanie a písomné prehľady, čitateľné fotokópie dokladov preukazujúce použitie dotácie ako sú: daňové doklady - faktúry, pokladničné doklady, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, preberacie protokoly, doklady o zaradení obstaraného majetku, výpisy z účtu o prijatí finančných prostriedkov, výberoch, bezhotovostných platbách a pod.

Na účet obce bola poukázaná suma 20 000,00 eur v zmysle zmluvy s poskytovateľom. Kontrolou bolo zistené, že skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 19 043,37 eur, uznané čerpanie poskytovateľom bolo v sume 18 728,15 eur a nevyčerpané prostriedky v sume 956,63 eur boli vrátené na účet poskytovateľa po zmluvne stanovenom termíne.

Tým, že nevyčerpané finančné prostriedky neboli vrátené na účet poskytovateľa do 10 dní odo dňa určeného na použitie finančných prostriedkov, nebolo dodržané ustanovenie čl. II, bod 7.2 zmluvy, podľa ktorého prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutých finančných prostriedkov. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 10-tich

pracovných dní do dňa určeného na použitie finančných prostriedkov v zmysle čl. II, bodu 5 zmluvy.

Zároveň bola porušená finančná disciplína v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu.

Po uznaní a odsúhlasení výdavkov bola na účet poskytovateľa vrátená ešte suma 315,22 eur v zmluvne stanovenom termíne, pričom výnosy nevznikli žiadne.

Skontrolované boli všetky doklady preukazujúce použitie dotácie. Kontrola preukázala, že všetky položky rozpočtu boli opodstatnené a v súlade s prílohou č.1 zmluvy, ktorou bol štruktúrovaný rozpočet projektu.

Obec bola povinná vyúčtovať finančné prostriedky v termíne do 15.04.2012. Na základe písomného usmernenia poskytovateľa bolo akceptované predloženie vyúčtovania najneskôr do termínu 30.4.2012.

Kontrolou bolo zistené, že finančné prostriedky boli vyúčtované 25.04.2012, čím nebolo dodržané ustanovenie čl. II ods. 5 zmluvy, podľa ktorého poskytnuté finančné prostriedky v zmysle čl. I. zmluvy je prijímateľ povinný vyúčtovať v termíne do 15.04.2012.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 30.07.2014

Ing. Katarína Kuciaková
vedúca kontrolnej skupiny

Ing. Miloš Tomka
člen kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa: 11.08.2014

Jozef Húserka
starosta

Príloha č. 1

Obr. 1 oceľová odrážka



Obr. 2 oceľová odrážka



Obr. 3 oceľová odrážka



Obr. 4 drevená odrážka



Obr. 5 drevená odrážka



Obr. 6 drevená odrážka




Obr. 7 prehrádzka



Obr. 8 prehrádzka



Obr. 9 prehrádzka

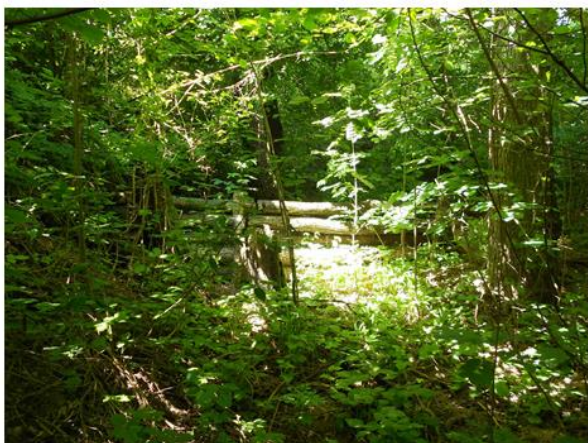

Obr. 10 prehrádzka



Obr. 11 prehrádzka



Obr. 12 prehrádzka



Obr. 13 retenčná nádrž



Obr. 14 retenčná nádrž

