



STAV PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI V MÁJI 2024

Slovensko bude musieť revidovať svoje ciele

Do apríla 2024 si Slovenská republika podala štyri žiadosti o platbu z plánu obnovy a odolnosti (POO)¹, z toho tri platby jej už boli vyplatené (spolu viac ako 2 mld. eur z celkovej sumy 6,4 mld. eur). Od začiatku implementácie POO sa v SR zatiaľ vyčerpalo 473,4 mil. eur (7,39 % z celkovej alokácie). Prostriedky z POO na rok 2024 sú rozpočtované v objeme 1,215 mld. eur v 12 kapitolách. Do roka 2026 má SR podať ešte päť žiadostí o platbu v objeme viac ako 3 mld. eur. Najväčší počet kritických míľnikov je momentálne v gescii MZ SR, MŽP SR, MIRRI SR a MV SR. Súčasťou POO je aj viac ako 30 investičných projektov nad 20 mil. eur. Najväčšie investičné projekty sú na MZ SR spolu v sume viac ako 828 mil. eur.

Na základe skúseností z doterajšej kontrolnej činnosti², NKÚ SR odporúča vláde na pravidelnej báze prehodnocovať schopnosť zodpovedných inštitúcií realizovať investičné zámery a posudzovať pripravenosť investičných zámerov v jednotlivých fázach projektov; a v prípade nutnosti odporúča upravovať zoznam reforiem zahrnutých do POO.

Slovensko dostalo z POO od Európskej komisie (EK) k 1. štvrtroku 2024 spolu viac ako 2 mld. eur³ (tabuľka 1). POO pre SR pozostáva celkovo z deviatich platieb. Doteraz si Slovensko podalo štyri žiadosti o platbu, z toho na základe troch žiadostí už boli prostriedky vyplatené. Štvrtá žiadosť o platbu v hodnote viac ako 923 mil. eur, ktorú SR poslala 15. 12. 2023, je momentálne posudzovaná na úrovni EK. Štandardne má EK dva mesiace od predloženia žiadosti o platbu na jej posúdenie. Lehota na posúdenie štvrtej žiadosti sa však predĺžila nad rámec štandardného času a dátum oficiálneho hodnotenia EK bude závisieť od poskytnutia všetkej potrebnej a dodatočnej dokumentácie zo strany SR⁴.

Tabuľka 1: Prehľad platieb POO z EK pre Slovensko

	Počet míľnikov	Dátum podania žiadosti	Dátum prijatia platby	Výška platby v mil. eur*	Stav
1. platba	14	29.4.2022	26.6.2022	458,3	vyplatená
2. platba	16	25.10.2022	22.3.2023	814,7	vyplatená
3. platba	27	25.9.2023	28.12.2023	814,7	vyplatená
4. platba	15	15.12.2023	-	923,8	predložená - pozastavená zo strany EK s predĺženou dobou hodnotenia
5. platba	22	predpoklad 2024	-	597,8	priebežné plnenie míľnikov a cieľov
6. platba	29	predpoklad 2025	-	1005	-
7. platba	20	predpoklad 2025	-	694	-
8. platba	26	predpoklad 2026	-	550	-
9. platba	53	predpoklad 2026	-	550	-

Zdroj: POO.

*Suma v jednotlivých platbách zahŕňa aj predfinancovanie, ktoré bolo vyplatené SR 13. 7. 2021 v sume 822 mil. eur.

¹ Na úrovni EÚ je POO vo forme grantu a/alebo aj pôžičky. POO na Slovensku pozostáva len z grantovej časti.
² NKÚ SR. 2023. Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina. [online].
³ Finančné prostriedky EK prevedie na účet Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), vedený v Štátnej pokladnici. Tieto prostriedky sa zaraďujú pri čerpaní do príjmov štátneho rozpočtu po prevode na účet kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
⁴ Súčasťou posudzovania žiadosti o platbu je aj kontrola, či sa žiaden z predtým splnených míľnikov nezvrátil. Pre schválenie žiadosti sú predmetom diskusie s EK dva míľniky – reforma dôchodkového systému (4. žiadosť) a zavedenie výdavkových stropov/limitov (1. žiadosť).

Do roka 2026 má SR podať ešte päť žiadostí o platbu v celkovom objeme viac ako 3 mld. eur. Žiadosť o platbu si SR môže podať až po splnení náležitých míľnikov a cieľov, vopred dohodnutých v zmluve o POO. V rámci piatich posledných žiadostí ich treba splniť 150, a zároveň nezvrátiť žiaden už splnený míľnik z predchádzajúcich žiadostí.

K máju 2024 hrozí z 22 míľnikov a cieľov piatej žiadosti o platbu riziko nesplnenia pri jednej investícii a jednej reforme (tabuľka 7 v prílohe). Piata žiadosť pozostáva celkovo z ôsmich investícií a 14 reforiem. Ako riziková je vnímaná investícia „Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi“, ktorej vykonávateľom je MŽP SR s plánovaným termínom 4. štvrtrok 2023 a reforma „Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska“, ktorej vykonávateľom je MZ SR tiež s plánovaným termínom 4. štvrtrok 2023.

Súčasťou POO je aj viac ako 30 investičných projektov s hodnotou nad 20 mil. eur⁵ (tabuľka 8 v prílohe). Sú to predovšetkým investície do oblasti zdravotníctva a dopravy. Najväčšie z nich sú projekty „Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici“ (368 mil. eur), „Trať Bánovce nad Ondavou – Humenné“ (259 mil. eur) a „Univerzitná nemocnica Martin“ (256 mil. eur).

Spolu od začiatku implementácie a čerpania POO v roku 2021 do apríla 2024 SR vyčerpala 473,4 mil. eur (tabuľka 2), čo predstavuje 7,39 % z celkovej alokácie. Ku koncu roka 2022 sa vyčerpalo takmer 49 mil. eur (3,76 % z rozpočtovanej sumy na rok 2022), z toho väčšinu predstavovali bežné výdavky⁶.

Tabuľka 2: Čerpanie POO podľa bežných a kapitálových výdavkov (v mil. eur)


	Čerpanie 2021	Rozpočet 2022	Čerpanie 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 2024*
Bežné výdavky	6,07	347,35	46,66	369,27	113,67	352,00	22,54
Kapitálové výdavky	-	954,62	2,31	1 641,99	260,50	863,40	21,6
SPOLU	6,07	1 301,97	48,97	2 011,25	374,17	1 215,40	44,14

Zdroj: Rozpočtový informačný systém (RIS).

* Čerpanie v roku 2024 je k 30. 4. 2024.

Ku koncu roka 2023 sa vyčerpalo 18,6 % z rozpočtovanej sumy na rok 2023 (2 mld. eur) (graf 1). Z rozpočtovaných výdavkov sa vyčerpalo 374,2 mil. eur, s čím súvisia výdavky na platbu DPH na úrovni 15,7 mil. eur. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 113,7 mil. eur a kapitálové výdavky predstavovali 260,5 mil. eur.

Graf 1 Prehľad rozpočtovanej a čerpanej sumy v rámci POO v rokoch 2022 – 2024* (v mil. eur)

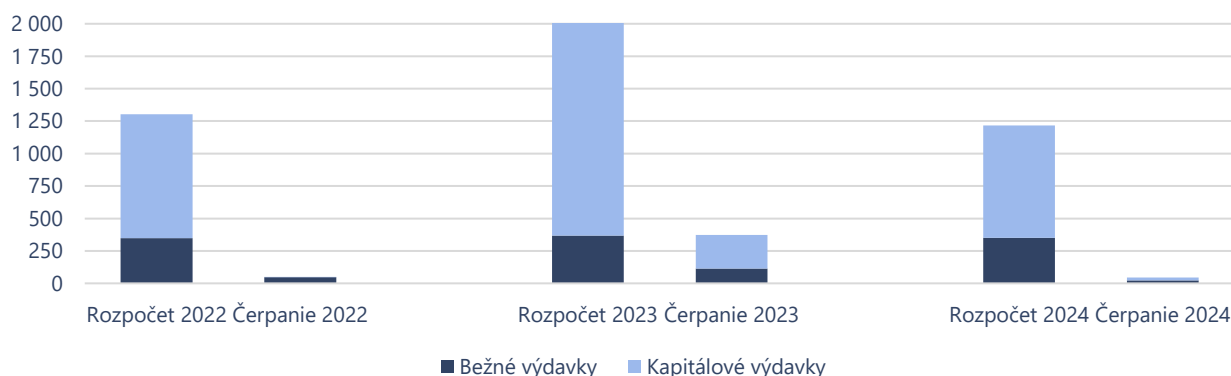

Zdroj: RIS.

* Čerpanie v roku 2024 je k 30. 4. 2024.

⁵ Bližšie informácie o plnení harmonogramu investičných projektov sú zverejňované len pri projektoch nad 20 mil. eur. [online].

⁶ Alokácia na projekty POO sa rozpočtuje v prvom roku a nie až pri plnení míľnikov a cieľov, čím vznikajú rozdiely medzi rozpočtovanými a skutočnými výdavkami.

Spomedzi jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu v roku 2023 najviac z POO vyčerpalo MŽP SR (193 mil. eur) (tabuľka 3). Medzi najväčšie výdavkové položky v roku 2023 patrili bežné výdavky právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom (15,4 mil. eur), príspevkovej organizácii (15,4 mil. eur), verejnej vysokej škole (12,4) a tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad (11,9 mil. eur). V kapitálových výdavkoch najväčšiu položku tvorili výdavky príspevkovej organizácii (187,2 mil. eur), nákup osobných automobilov v rezorte vnútra⁷ (34,9 mil. eur) alebo výdavky do budov, objektov alebo ich častí (17,7 mil. eur). Najväčšie položky sú detailnejšie rozpísané v tabuľke 9 v prílohe. Všetky nevyčerpané prostriedky sa presunú do nasledujúcich rokov⁸.


Tabuľka 3: Celkové čerpanie POO v kapitolách štátneho rozpočtu v období 2021 – 2024 (v mil. eur)

Kapitola	Čerpanie 2021	Rozpočet 2022	Čerpanie 2022	Rozpočet 2023	Čerpanie 2023	Rozpočet 2024	Čerpanie 2024*
MŽP SR	0,65	181,32	3,850	527,75	193,717	224,47	4,79
MV SR	3,09	57,38	5,087	50,61	41,215	27,14	1,2
MŠVVaM SR	2,21	334,21	25,751	307,21	40,134	123,60	15,7
ÚV SR	0,12	114,29	3,987	126,90	26,412	116,27	2,77
MS SR	-	55,81	0,536	157,70	23,636	11,29	0,01
MZ SR	-	184,55	3,070	377,43	18,975	228,57	2,07
MIRRI SR	-	66,26	2,529	119,64	15,281	175,81	4,91
MH SR	-	119,94	0,538	136,69	5,876	97,67	0,23
MPSVaR SR	-	33,11	0,138	57,07	5,699	44,30	9,3
MK SR	-	3,49	1,522	3,20	2,619	0,00	0
MZV SR	-	0,54	0,000	0,00	0,000	0,00	0
ÚVO	-	0,51	0,029	0,45	0,200	0,44	0,12
VPS	-	0,00	1,930	0,00	0,067	0,00	0,26
MO SR	-	0,00	0,000	0,00	0,010	0,00	0,14
MF SR	-	0,00	0,000	0,00	0,000	1,56	0
MD SR	-	150,55	0,000	146,59	0,332	164,27	2,64
Spolu	6,07	1 301,97	48,966	2 011,25	374,174	1 215,40	44,14

Zdroj: RIS.

* Čerpanie v roku 2024 je k 30. 4. 2024.

Graf 2: Prostriedky z POO rozpočtované v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu v 2024 (v mil. eur)

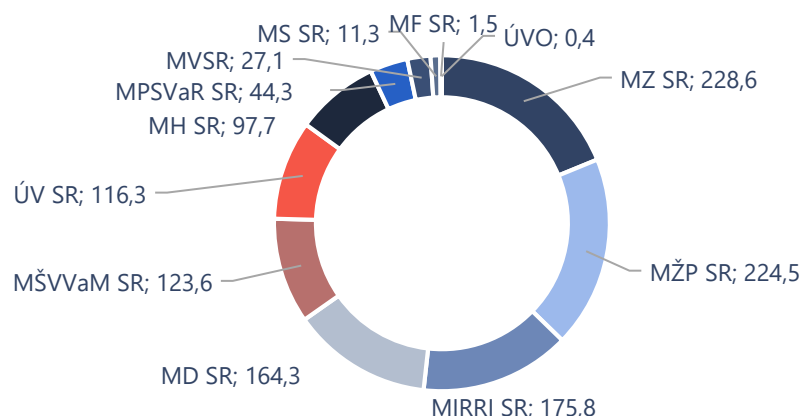

Zdroj: Návrh RVS na roky 2024 – 2026.

⁷ Nákup osobných automobilov bol realizovaný v rámci komponentu Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí v investícii s názvom Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) – elektrických a hybridných vozidiel. Cieľom projektu bol nákup 705 elektrických a hybridných vozidiel pre policajný zbor a následná obmena vozového parku policajného zboru.

⁸ Prostriedky z POO možno čerpať do roku 2026.

Prostriedky z POO na rok 2024 sú rozpočtované v objeme 1,215 mld. eur v 12 kapitolách (graf 2), **z toho ku koncu apríla bolo vyčerpaných 44,14 mil. eur** (tabuľka 3). Z doteraz čerpaných prostriedkov tvorili 21,6 mil. eur kapitálové výdavky a 22,54 mil. eur bežné výdavky. Z celkových výdavkov viac ako jednu tretinu vyčerpalo MŠVVaM SR. Najväčší objem prostriedkov z POO je rozpočtovaný na MZ SR (228,6 mil. eur) a MŽP SR (224,5 mil. eur) (graf 2). V prípade MŽP SR táto suma tvorí až 50 % rozpočtu celej kapitoly.

Z oblastí POO je najvyššie čerpanie od začiatku implementácie v oblasti zelená ekonomika (210,8 mil. eur) **a efektívna verejná správa a digitalizácia** (106,9 mil. eur). Z komponentov je najvyššie čerpanie v komponente 2 – Obnova budov (197 mi. eur) a komponente 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva (58,9 mil. eur) (tabuľka 4).

Tabuľka 4: Alokácia a čerpanie z POO podľa komponentov k 30. 4. 2024

Oblasť	Komponent	2021	2022	2023	2024*	Alokácia
Zelená ekonomika	Komponent 1 - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra	0,00	0,48	0,88	0,00	207
	Komponent 2 - Obnova budov	0,65	4,51	187,43	4,46	620
	Komponent 3 - Udržateľná doprava	0,00	0,00	0,47	1,44	759
	Komponent 4 - Dekarbonizácia priemyslu	0,00	0,66	1,86	0,84	368
	Komponent 5 - Adaptácia na zmenu klímy	0,00	0,21	6,41	0,54	149
Vzdelávanie	Komponent 6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch	0,73	11,62	14,22	4,44	210
	Komponent 7 - Vzdelávanie pre 21. storočie	0,18	10,36	13,34	10,52	449
	Komponent 8 - Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl	1,30	0,06	3,61	0,00	159
Veda, výskum, inovácie	Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií	0,00	1,67	27,56	2,07	576
	Komponent 10 - Lákanie a udržanie talentov	0,00	4,19	9,16	0,44	94
Zdravie	Komponent 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť	0,00	2,92	14,71	0,87	1072
	Komponent 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie	0,00	0,15	1,12	0,02	83
	Komponent 13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť	0,00	0,14	8,84	10,48	247
Efektívna verejná správa a digitalizácia	Komponent 14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia	0,00	0,15	0,94	0,11	11
	Komponent 15 - Reforma justície	0,00	0,47	23,64	0,01	233
	Komponent 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva	3,21	8,86	43,97	2,81	209
	Komponent 17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)	0,00	2,53	15,28	4,91	561
	Komponent 19 - REPowerEU	0,00	0,00	0,72	0,19	403
Spolu	Spolu	6,07	48,97	374,17	44,14	6 410

Zdroj: MF SR. čerpanie 2024 je k 30. 4. 2024

Najväčší počet kritických investícií a reforiem v počte deväť je aktuálne pod gesciou MZ SR, a po štyri pod MIRRI SR, MŽP SR a MV SR (tabuľka 5).

Tabuľka 5: Počet ohrozených investícií a reforiem v 5. – 9. žiadosti o platbu

Rezort	február 2024	apríl 2024	máj 2024
MD SR	0	1	1
MH SR	1	1	1
MIRRI SR	2	3	4
MPSVR SR	0	0	0
MS SR	1	1	2
MŠVVaM SR	3	1	0
MV SR	0	3	4
MZ SR	3	7	9
MŽP SR	6	4	4
SPOLU	16	21	25

Zdroj: Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. [online]. údaje k 2/2024, 4/2024 a 5/2024.

Implementácia nenapreduje požadovaným tempom v prípade 25 investícií a reforiem v piatej až deviatej žiadosti o platbu (tabuľka 6). Tieto investície a reformy obsahujú úlohy, ktoré neboli splnené v stanovenom termíne alebo hrozí nesplnenie úlohy. Potreba prísneho projektového manažmentu, včasného dokončenia a splnenia mílnikov a dôkladnej dokumentácie je najvyššou prioritou, aby sa zabezpečil pokračujúci tok financií z EÚ v rámci POO.

Tabuľka 6: Najkritickejšie investície a reformy z POO k máju 2024

MZ SR		
Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)		
Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4)	8. žiadosť o platbu	Q4 2025
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5)		
Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (K11R3)	5. žiadosť o platbu	Q4 2023
Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)	6. a 9. žiadosť o platbu	Q1 2024, Q2 2026
Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12R1)	7. žiadosť o platbu	Q2 2025
Zriadenie fondu psychodiagnostických metód (K12I6)	7. žiadosť o platbu	Q2 2025
Investície v rámci komponentov 12 a 13 v gescii MZ SR, v rámci ktorých sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoPPM	7.-9. žiadosť o platbu	Q1 2025, Q2 2026
Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)	8. žiadosť o platbu	Q4 2025
MIRRI SR		
Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)	6. a 9. žiadosť o platbu	Q4 2024, Q2 2026
Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)	6. a 8. žiadosť o platbu	Q4 2024, Q4 2025
Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)	6. a 7. žiadosť o platbu	Q4 2024, Q2 2025
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17I7)	9. žiadosť o platbu	Q2 2026
MV SR		
Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)	9. žiadosť o platbu	Q2 2026
Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)	7. a 9. žiadosť o platbu	Q2 2025, Q2 2026
Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokoškolských zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku (K10I1)	6. žiadosť o platbu	Q4 2024
Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)	6. žiadosť o platbu	Q4 2024
MŽP SR		

Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)	7. a 9. žiadosť o platbu	Q2 2025, Q2 2026
Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)	9. žiadosť o platbu	Q2 2026
Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)	6. žiadosť o platbu	Q4 2024
Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)	5. a 8. žiadosť o platbu	Q4 2023, Q4 2025
MS SR		
Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1)	8. žiadosť o platbu	Q4 2025
Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2)	8. žiadosť o platbu	Q4 2025
MH SR		
Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov (K19I2)	7. žiadosť o platbu	Q1 2025
MD SR		
Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)	9. žiadosť o platbu	Q2 2026

Zdroj: Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. [online]. údaje k 21. 5. 2024.

Vysokorizikové sú aj tri investície v rámci komponentu 12 (Humánna a dostupná starostlivosť o duševné zdravie), ktorej vykonávateľom je MZ SR. Implementácia týchto investícií je naplánovaná do konca roka 2025, avšak NIKA v správe upozorňuje, že už nie je dostatočný čas potrebný na výstavbu nových budov či realizáciu rekonštrukcií a s nimi súvisiace procesy (vysporiadanie vlastníckych vzťahov, vydanie stavebných povolení, vyhlasovanie verejného obstarávania). Na základe výsledkov kontroly z roku 2023 NKÚ SR konštatuje, že MZ SR nie je dostatočne metodicky a personálne pripravené na realizáciu veľkých investičných projektov.⁹

Ak členský štát z objektívnych dôvodov nie je ďalej schopný realizovať niektoré opatrenia POO, vrátane míľnikov a cieľov, môže požiadať o zmenu na úpravu dotknutých opatrení. Následne EK musí vyhodnotiť opodstatnenosť a relevantnosť predložených návrhov. Celkovo vykonávatelia POO k 15. 12. 2023 navrhli 50 návrhov na úpravu opatrení, čo predstavuje takmer jednu štvrtinu z celkového počtu 222 míľnikov a cieľov v POO. NIKA vyhodnotila 12 z týchto návrhov (tabuľka 10 v prílohe) ako relevantných pre potenciálnu revíziu POO v roku 2024. Pri argumentovaní objektívnych dôvodov neplnenia míľnikov/cieľov je potrebné preukázať dve veci. Jednak okolnosti, ktoré znemožnili implementáciu opatrenia, ktoré členský štát nemohol nijako ovplyvniť, a tiež to, že nebolo možné tieto okolnosti predvídať.

⁹ Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina. [online].

PRÍLOHY

Tabuľka 7: Stav piatej žiadosti o platbu k 17. 5. 2024

Termín	Kód	Typ	Vykonávateľ	Stav k 17.5.2024	Názov míľnika, cieľa
Q3 2023	K8I1	investícia	MŠVVaM SR		Uzavreté aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja vysokých škôl
Q3 2023	K6R5	reforma	MŠVVaM SR		Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie
Q4 2023	K2R2	reforma	MK SR		Metodiky pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
Q4 2023	K3R2	reforma	MD SR		Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného grafikonu železničnej dopravy
Q4 2023	K4R1	reforma	MH SR, MŽP SR, MIRRI		Prechod od využívania uhlia v regióne Hornej Nitry
Q4 2023	K5R1	reforma	MŽP SR		Reforma krajinného plánovania
Q4 2023	K5I1	investícia	MŽP SR		Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkami
Q4 2023	K7R2	reforma	MŠVVaM SR		Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inklúziom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach
Q4 2023	K8R1	reforma	MŠVVaM SR		Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami
Q4 2023	K9I6	investícia	ÚV SR		Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií
Q4 2023	K11R3	reforma	MZ SR		Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska
Q4 2023	K11I3	investícia	MZ SR		Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení v 3 ústavoch srdcovocievnych chorôb
Q4 2023	K13R1	reforma	MPSVaR SR		Predloženie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu
Q4 2023	K16I1	investícia	MV SR, ÚV SR		Poskytnutie potrebnej infraštruktúry na podporu boja proti praniu špinavých peňazí a korupcii
Q4 2023	K16I1	investícia	MV SR		Rekvalifikácia príslušníkov polície vo finančných vyšetrovaniach a analytických činnostiach
Q4 2023	K17R1	reforma	MIRRI SR		Plán prioritných životných situácií
Q4 2023	K17R2	reforma	MIRRI SR		Centrálna platforma na využívanie zdrojov IT (digitálne trhovisko)
Q1 2024	K9I3	investícia	ÚV SR		Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov
Q1 2024	K13R2	reforma	MPSVaR SR		Zjednotenie posudkovej činnosti
Q1 2024	K13R3	reforma	MPSVaR SR		Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami
Q2 2024	REPowerEU R2	reforma	MH SR		Zverejnenie Akčného plánu pre vodík
Q3 2024	REPowerEU I1.4	investícia	MH SR		Uvedenie Energetického dátového centra do prevádzky

Zdroj: POO.

Vysvetlivky: stav - číslo nesplnenia míľnika/cieľa, oneskorenie míľnika/cieľa, predpoklad splnenia do predloženia žiadosti o platbu, splnené, bez farby – podľa plánu.

Tabuľka 8: Prehľad investičných projektov v POO s hodnotou nad 20 mil. eur

Názov projektu	Stav projektu	Rozpočet (v mil. eur)	Zodpovedný rezort
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici		368	MZ SR
Trat' Bánovce nad Ondavou – Humenné		259	MD SR
Univerzitná nemocnica Martin		256	MZ SR
Digitálna infraštruktúra v školách		190	MŠVVaM SR
Nasadenie platformy IT zdrojov, eSKa cloud		46	MIRRI SR
Modernizácia elektrickej stanice a zaslučkovanie vedenia		45,1	MH SR
Rekonštrukcia trate Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom		44,3	MD SR
Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) – elektrických a hybridných vozidiel		43,5	MV SR
Rekonštrukcia lôžkového pavilónu HOTFLOOR Nemocnica AGEL Levice		42,4	MZ SR
Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad		42,3	MZ SR
Nákup 5 ks ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu		42	MD SR
Nákup 5 ks ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu II		42	MD SR
Komplexná rekonštrukcia železničnej trate Hronský Beňadik – Nová Baňa		41,4	MD SR
Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum		40,8	MIRRI SR
Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií		40	MIRRI SR
Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves		39,5	MZ SR
Modernizácia prenosových vedení		38,5	MH SR
Implementácia nového zabezpečovacieho zariadenia a systému ERTMS na trati Devínska Nová Ves – Kúty – štátna hranica		35	MD SR
Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby		32	MZ SR
Úplné sfunkčnenie automatizácie systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky		29,7	MV SR
Modernizácia súdneho IT vybavenia pre zamestnancov súdov		29,1	MS SR
Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach		27,1	MS SR
Komplexná rekonštrukcia výhybiek v ŽST Levice a nové zabezpečovacie zariadenia na trati Levice – Veľké Kozmálovce		26,5	MD SR
Prístavba lôžkovej časti k chirurgickému pavilónu Nemocnica AGEL Zvolen		25,8	MZ SR
Nákup 10 ks jednosmerných električiek pre Bratislavu		24	MD SR
Modernizácia budovy Krajského súdu v Bratislave		23,8	MS SR
Komplexná rekonštrukcia koľaje na trati Nižná Myšľa – Ruskov		23,4	MD SR
Novostavba lôžkového pavilónu vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica		22,7	MZ SR
Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava Rača - Leopoldov		22,6	MD SR
Rekonštrukcia železničného zvršku a železničného spodku ŽST Filákov – výhybňa Holiša		21,6	MD SR
Rekonštrukcia trate Bratislava Nové Mesto – Bratislava Ústredná nákladná stanica		21,6	MD SR
Obstaranie a modernizácia budovy Okresného súdu v Banskej Bystrici		20,5	MS SR

Zdroj: POO.

Vysvetlivky: stav - **označenie nesplnenia parciálneho cieľa**, **oneskorenie parciálneho cieľa (ale stále možný predpoklad splnenia)**, **splnené**, bez farby – podľa plánu.

Tabuľka 9: Prehľad čerpania najväčších bežných a kapitálových výdavkov POO v roku 2023 (v eurách)

Bežné výdavky podľa kódu	Čerpanie	Kapitálové výdavky podľa kódu	Čerpanie
644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	15 375 600,00	721001 Príspevkovej organizácii	187 166 996,34
641001 Príspevkovej organizácii	15 362 287,44	714001 Osobných automobilov	34 899 968,01
641008 Verejnej vysokej školy	12 432 077,71	712001 Budov, objektov alebo ich častí	17 714 164,63
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 914 543,06	721009 Ostatným subjektom verejnej správy	7 347 914,65
633002 Výpočtová technika	7 347 488,11	723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001	2 651 355,20
644002 Ostatnej právnickej osobe	6 041 699,92	711003 Softvéru	2 411 574,20
641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 745 859,91	722003 Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722001 a podpoložke 722002	1 508 795,40
642009 Nefinančnej právnickej osobe	4 694 757,83	713002 Výpočtovej techniky	1 264 616,57
637005 Špeciálne služby	3 036 733,20	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	1 097 913,62
642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 021 440,13	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	943 375,13
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 880 979,20	716 Prípravná a projektová dokumentácia	829 887,60
612001 Osobný príplatok	2 646 109,52	721006 Obci	757 716,03
625002 Na starobné poistenie	2 553 748,85	718007 Komunikačnej infraštruktúry	553 967,32
642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	1 968 751,18	713006 Komunikačnej infraštruktúry	370 226,79
642200 Ostatné	1 961 685,63	718006 Softvéru	309 143,24
641012 Ostatným subjektom verejnej správy	1 897 714,30	722001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	251 167,00
641020 Verejnej výskumnej inštitúcii	1 827 933,48	711004 Licencií	240 297,94
614 Odmeny	1 732 986,89	721002 Rozpočtovej organizácii	100 000,00
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 424 843,10	723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi	32 340,81
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	978 457,50	713001 Interiérového vybavenia	18 390,00
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	819 059,04	713003 Telekomunikačnej techniky	17 031,50
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	788 885,11	719012 Na osobitné finančné prostriedky	8 600,00
642005 Súkromnej škole	763 471,51	718002 Výpočtovej techniky	3 817,17
637003 Propagácia, reklama a inzercia	737 867,57		
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	702 888,44		
633018 Licencie	575 342,15		
641010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	551 852,00		
637004 Všeobecné služby	536 525,56		
649003 Medzinárodnej organizácii	525 000,00		
625004 Na invalidné poistenie	524 793,20		
635009 Unikátneho softvéru	426 151,80		
642004 Cirkevnej škole	357 498,71		
636001 Budov, objektov alebo ich častí	277 283,52		
625001 Na nemocenské poistenie	248 516,78		
641017 Železniciam Slovenskej republiky	242 050,83		
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	219 644,17		

633001 Interiérové vybavenie	197 441,28
625005 Na poistenie v nezamestnanosti	182 071,41
633006 Všeobecný materiál	170 346,97
625003 Na úrazové poistenie	156 123,55
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	148 184,42
637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	143 138,95

Zdroj: RIS.

Tabuľka 10: Prehľad reforiem a investícií, ktoré sú predmetom potenciálnej revízie POO

K6 R1 Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov	
MŠVVaM SR	
Cieľ	9 114 novovytvorených miest v materských školách
Termín	Q2 2026
Žiadosť	9. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Zníženie cieľa z dôvodu nižšej reálnej potreby, alikvotné zníženie alokácie.
K7 I2 Dobudovanie školskej infraštruktúry	
MŠVVaM SR	
Cieľ	odstránenie dvojzmennej prevádzky na 35 školách
Termín	Q2 2026
Žiadosť	9. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Zníženie cieľa z dôvodu nemožnosti realizovať opatrenie bez porušenia princípov desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.
K13 I3 Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	
MZ SR	
Cieľ	Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (ukazovateľ: počet prevádzkovateľov nových a prestavaných hospicov)
Termín	Q1 2025
Žiadosť	7. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Zníženie počtu podporených novovzniknutých mobilných hospicov z pôvodných 20 na 16 a zvýšenie počtu existujúcich mobilných hospicov z pôvodných 6 na 10. Spolu by sa podporil rovnaký počet 26 hospicov.
K13 I2 Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti	
MZ SR	
Cieľ	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok (ukazovateľ: minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti)
Termín	Q1 2025
Žiadosť	7. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	MZ SR navrhuje miernu modifikáciu popisu cieľa tak, aby bolo možné nové lôžka následnej starostlivosti vytvoriť nielen rekonštrukciou akútnych a chronických, ale aj iných typov lôžok.
K13 R2 Posudzovanie potrieb starostlivosti	
MPSVR SR	
Cieľ	Zjednotenie systému posudzovania

Termín	Q1 2024
Žiadosť	5. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Posun termínu splnenia mílnika na z Q1 2024 na Q4 2025.

K13 I1 Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

MPSVR SR

Cieľ	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity)
Termín	Q2 2024, Q2 2026
Žiadosť	6. a 9. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Rozšírenie kapacít ambulantnej služby (ukazovateľ: minimálny počet vytvorených jednotiek váženej kapacity) / parciálny cieľ. Zlúčenie kvantitatívnych ukazovateľov (cieľových hodnôt) v rámci Investície 1 do jedného spoločného pre ambulantné aj pobytové služby komunitnej sociálnej starostlivosti.

K15 I2 Digitalizácia a analytické kapacity

MS SR

Cieľ	Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia (Nové súdne podania možno spracúvať digitálne)
Termín	Q4 2025
Žiadosť	8. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Zníženie ambície cieľa daného mílnika - jeho čiastočné plnenie.

K9 I1 Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

ÚV SR

Cieľ	Finančná podpora prihlášok a zapojených projektov v programoch Horizont Európa dosiahne v rámci výziev financovaných z fondu obnovy
Termín	Q2 2026
Žiadosť	9. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Úprava cieľa tak, aby sa reportoval počet projektov a nie suma vyplatených prostriedkov.

K4 I1 Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu

MŽP SR

Cieľ	Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z Plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2)
Termín	Q2 2026
Žiadosť	9. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Implementácia opatrenia tak, ako ju predpokladá v súčasnosti platné Vykonávacie rozhodnutie nie je objektívne možná, a úprava spôsobu implementácie predmetného cieľa tak, aby bolo možné opatrenie implementovať do 30. júna 2026, je pravdepodobne potrebná.

K5 I1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

MŽP SR

Cieľ	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníckmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) – aspoň 12 258 ha a 23 640 ha
Termín	Q4 2023, Q4 2025
Žiadosť	5. žiadosť o platbu, 8. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Vykonávateľ navrhuje nahradenie predmetného opatrenia novým opatrením.

K5 I1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity

MŽP SR	
Cieľ	Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 52km a 90 km
Termín	Q4 2024, Q2 2026
Žiadosť	6. a 9. žiadosť o platbu
Podstata navrhovanej zmeny	Vykonávateľ navrhuje výrazné zníženie parciálneho aj celkového cieľa, a to poníženie z 52 km na 10 km revitalizovaných tokov pri parciálnom ciele a poníženie z 90 km na 40 km, resp. 20 km revitalizovaných tokov pri celkovom ciele. Zároveň navrhuje posun termínu parciálneho cieľa z Q4 2024 na Q4 2025 a pri celkovom ciele možnosť ukončenia revitalizačných prác až v Q4 2026.

Zdroj: Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. [\[online\]](#).
