

2019

Závěrečná správa

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach
OP EŠIF



Závěrečná správa

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF

PREDKLADÁ

Ing. Karol Mitrik, predseda
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Bratislava, december 2019

OBSAH

ZOZNAM SKRATIEK.....	4
ZOZNAM GRAFOV	4
ZHRNUTIE	5
1 ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE	6
2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE.....	6
3 ZISTENIA A ODPORÚČANIA.....	6
3.1. MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR	6
3.2. MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR	8
3.3. RIZIKÁ V PROCESE MONITOROVANIA A KONTROLY PROJEKTOV	9
4 REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU	10
5 TÍM KONTROLÓROV	10
ZÁVER	10
KONTAKT	11
PRÍLOHA	12

ZOZNAM SKRATIEK

SKRATKA / SKRÁTENÉ POMENOVANIE	VÝZNAM
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
MF SR	Ministerstvo financií SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
NFP	Nenávratný finančný príspevok
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie
Zákon č. 357/2015 Z. z.	Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o VO	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZOZNAM GRAFOV

Graf č. 1: Stav čerpania prostriedkov za IROP podľa prioritných osí.....	8
Graf č. 2: Čerpanie prostriedkov za dve prioritné osi operačného programu Výskum a inovácie.....	9

ZHRNUTIE

Najvyšší kontrolný úrad SR systematicky kontroluje procesy spojené s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie. V predchádzajúcej kontrole za programové obdobie 2014 – 2020 už preveril kľúčový proces výberu projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tým je proces **výziev a vyzvaní a samotné schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok**.

Ďalším procesom, na ktorý sa zamerlal NKÚ SR, je **realizácia projektov** s dôrazom na účinne vynaložené finančné prostriedky. **Úrad kontrolu upriamil na to**, ako riadiace a sprostredkovateľské orgány **monitorujú a kontrolujú projekty** v súvislosti s napĺňaním ich cieľov a merateľných ukazovateľov. Zmyslom tohto procesu je zabrániť tomu, aby prijímateľ musel vrátiť finančné prostriedky pre nesplnenie cieľa projektu alebo pre porušenie podmienok poskytnutia príspevku.

NKÚ SR vykonal kontrolu v šiestnástich subjektoch. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program) a Ministerstve hospodárstva SR (sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie), teda na úrovni riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, a u štrnástich prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Kontrolóri preverili proces monitorovania a kontroly projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, pričom zistili nedostatky v účinnosti spomínaného procesu.

Celkovo zaznamenali kontrolóri 27 zistení. Kontrolné zistenia, okrem iného, upozorňujú tak na nesprávne stanovenie hodnôt merateľných ukazovateľov, ako aj na zlyhania riadiaceho či sprostredkovateľského orgánu pri odhaľovaní chýb v merateľných ukazovateľoch.

Riadiaci ani sprostredkovateľský orgán pre IROP neodhalili nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov nielen v procese schvaľovania projektov, ale ani počas ich realizácie.

Správnosť nastavenia merateľných ukazovateľov je priamo spojená s napĺňaním cieľov projektov, ktorých neplnenie môže mať za následok vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti.

Nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov projektu sa prostredníctvom centrálného informačného monitorovacieho systému dostávajú do celkových údajov za program a negatívne ovplyvňujú vypovedaciu schopnosť merateľných ukazovateľov na úrovni celého programu.

Kontrola poukázala na viaceré nedostatky vo vykonávaní procesov monitoringu a kontroly v rezorte pôdohospodárstva, na druhej strane v rezorte hospodárstva kontrola identifikovala v zavedenom systéme monitorovania a kontroly projektov **dobrú prax**. Spočíva v tom, že ministerstvo hospodárstva pripravilo pre operačný program Výskum a inovácie **metodikum overovania podmienok poskytnutia príspevku vo fázach realizácie a udržateľnosti projektu**. V podobe právneho dokumentu metodika zvyšuje prehľadnosť a jednotnosť procesov tak u prijímateľa finančného príspevku, ako aj sprostredkovateľského orgánu. Súčasne je **významným preventčným krokom pre zníženie chybovosti** v jednotlivých fázach projektu.

U oboch kontrolovaných ministerstiev upozornili kontrolóri **na nedodržanie lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii**, a to najmä pri výkone kontroly verejného obstarávania. Dlhé lehoty v rezorte hospodárstva sa týkali aj finančnej kontroly na mieste – od jej vykonania až po spracovanie správy z kontroly. Nedodržovanie lehôt riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom spomaľuje realizáciu projektov aj čerpanie finančných prostriedkov. Zvyšuje sa riziko nesplnenia pravidla „n+3“, teda nevyčerpanie stanovených finančných prostriedkov a ich následné prepadnutie – takzvaný decommitment.

Plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektov je nevyhnutné aj pre plnenie výkonnostného rámca a pridelenie výkonnostnej rezervy podľa pravidiel Európskej únie.

1 ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE

Kontrola NKÚ SR sa zamerala na procesy riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Jej účelom bolo posúdiť primeranosť procesu monitorovania a výkonu kontrol pri overovaní plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov. Tento proces by mal včas odhaliť prípadné problémy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli ohroziť úspešnosť realizácie projektu alebo viesť k povinnosti prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky.

Pri kontrole súladu s prvkami výkonnosti boli použité tieto techniky a postupy: preskúmanie dokladov a dokumentov; analýzy; písomné stanoviská k predmetu kontroly; rozhovory so zamestnancami kontrolovaných ministerstiev a prijímateľov finančného príspevku.

Predmetom kontroly bolo

– na úrovni riadiacich a sprostredkovateľských orgánov preveriť:

- 1) systém monitorovania a kontroly projektov vo vzťahu k overovaniu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov;
- 2) systém riadenia zmien v projektoch, a to aj v nadväznosti na udeľovanie korekcií (zníženie nenávratného finančného príspevku) v prípade zmien;
- 3) dohľad riadiacich orgánov nad sprostredkovateľskými orgánmi a vnútornú kontrolu v oblasti monitorovania a kontroly projektov.

– u prijímateľov nenávratného finančného príspevku preveriť plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektu.

2 RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

V súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2019 vykonal úrad kontrolu na dvoch ministerstvách a u štrnástich prijímateľoch nenávratného finančného príspevku (príloha č. 1).

Konkrétne na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „Ministerstvo pôdohospodárstva“) a na Ministerstve hospodárstva SR. Za každé ministerstvo preverili kontrolóri po sedem projektov, celkovo teda 14 projektov prijímateľov nenávratného finančného príspevku z európskych fondov.

V rámci kontroly súladu preverili kontrolóri súlad procesu monitorovania a kontroly so zákonmi a riadiacou dokumentáciou projektov.

Pri kontrole výkonnosti sa kontrolóri zamerali na plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektov a účinnosť procesov ich overovania.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o NKÚ SR a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií ISSAI.

3 ZISTENIA A ODPORÚČANIA

3.1 MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

Toto ministerstvo je riadiacim orgánom pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Jedným zo sprostredkovateľských orgánov pre prijímateľov príspevku je Trnavský samosprávny kraj, ktorý vykonáva časť úloh riadiaceho orgánu na území trnavského kraja. Preverené projekty sa týkali rozširovania kapacít materských škôl, ich obnovy a modernizácie.

Kontrola NKÚ SR zistila na úrovni riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu **nedostatky v účinnosti systému monitorovania a kontroly** projektov. Prijímatelia v projektoch **nesprávne stanovili cieľové hodnoty niektorých merateľných ukazovateľov**.¹ Jedným z dôvodov bola nejednoznačná definícia merateľných ukazovateľov stanovených vo výzve

¹ Konkrétne sa to týkalo štyroch nasledujúcich merateľných ukazovateľov: zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách; odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov; podlahová plocha renovovaných verejných budov; kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl.

riadiaceho orgánu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a z toho vyplývajúca možnosť rôzneho výkladu.

Nesprávne stanovenie cieľových hodnôt malo vplyv aj na následné nesprávne vykazovanie dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov po realizácii projektu, v monitorovacích správach. K najzávažnejším zisteniam kontrolórov patrí fakt, že **riadiaci ani sprostredkovateľský orgán neodhalili nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov nielen v procese schvaľovania projektov, ale ani v priebehu ich realizácie.**

Nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov boli vykazované aj v záverečných monitorovacích správach projektu; napr. v jednom prípade na základe nesprávne vykázaných dosiahnutých hodnôt merateľného ukazovateľa vykazoval projekt jeho plnenie len na úrovni 27 %. Z preverenej vzorky siedmich projektov tak kontrolóri až v piatich prípadoch odhalili **nedostatočné odborné hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a nedostatočnú kontrolu projektu.**

NKÚ SR na základe preverenej vzorky projektov identifikoval riziko, že nesprávne určené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa môžu vyskytovať aj v ďalších projektoch.

Nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov projektu sú evidované aj v centrálnom informačnom monitorovacom systéme, ktorý ich vykazuje v rámci celkových údajov za operačný program. Majú tak **negatívny vplyv na vypovedaciu schopnosť merateľných ukazovateľov na úrovni celého programu IROP.** Správne stanovené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov a vykázané reálne dosiahnuté hodnoty sú pritom hlavným predpokladom pre naplnenie cieľa projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.


V uplatňovanom systéme kontroly riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu **nebolo preukázané zabezpečenie overovania niektorých podmienok poskytnutia príspevku**; napríklad podmienky nebyť dlžníkom na daniach, sociálnom poistení a zdravotnom poistení. Kontrolóri pritom zdôrazňujú, že porušenie podmienok poskytnutia príspevku pri realizácii projektu a počas jeho udržateľnosti môže viesť k povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť. Ministerstvu pôdohospodárstva v tejto súvislosti kontrolóri odporučili využiť **dobrú prax** zistenú v rámci kontroly na ministerstve hospodárstva, ktoré pre operačný program Val pripravilo **metodikum overovania podmienok poskytnutia príspevku vo fázach realizácie a udržateľnosti projektu.**

Ďalším zistením je, že riadiaci ani sprostredkovateľský orgán vo viacerých prípadoch neskontrolovali dodatky k zmluve s dodávateľom či zhotoviteľom po ich predložení prijímateľom. Nepostupovali tak podľa zákona o finančnej kontrole a audite, ani podľa riadiacej dokumentácie.

Na strane prijímateľov príspevku kontrolóri zistili vo viacerých prípadoch nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tiež nesprávne stanovenie cieľových hodnôt a vykázanie reálne dosiahnutých hodnôt niektorých merateľných ukazovateľov projektu. Štyria prijímatelia v rámci ministerstva pôdohospodárstva nepredložili riadiacemu a sprostredkovateľskému orgánu dodatky k dodávateľským zmluvám na kontrolu verejného obstarávania podľa zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s riadiacou dokumentáciou. V jednom projekte kontrolóri identifikovali nerelevantnú aktivitu projektu, ktorá mala následne vplyv na stanovenie a plnenie merateľných ukazovateľov projektu. U jedného prijímateľa bolo zistené porušenie základných princípov zákona o verejnom obstarávaní v prípade uzatvorenia dodatkov k zmluve o dielo so zhotoviteľom, ktoré sa týkalo navýšenia ceny diela. NKÚ SR postúpil toto zistenie kontrolórov na základe dohody o spolupráci Úradu pre verejné obstarávanie na ďalšie riešenie.

Celkový objem prostriedkov na Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 – 2020 zo zdrojov Európskej únie predstavuje takmer 1,7 miliardy eur. Ku dňu ukončenia kontroly (október 2019) bolo z tejto sumy vyčerpaných takmer 277,3 milióna eur, čo je 16,3 percenta. Do konca roka 2023 tak z celkovej alokácie ostáva vyčerpať 1,4 miliardy eur.

Prehľad stavu čerpania finančných prostriedkov za IROP podľa prioritných osí poskytuje graf č. 1.

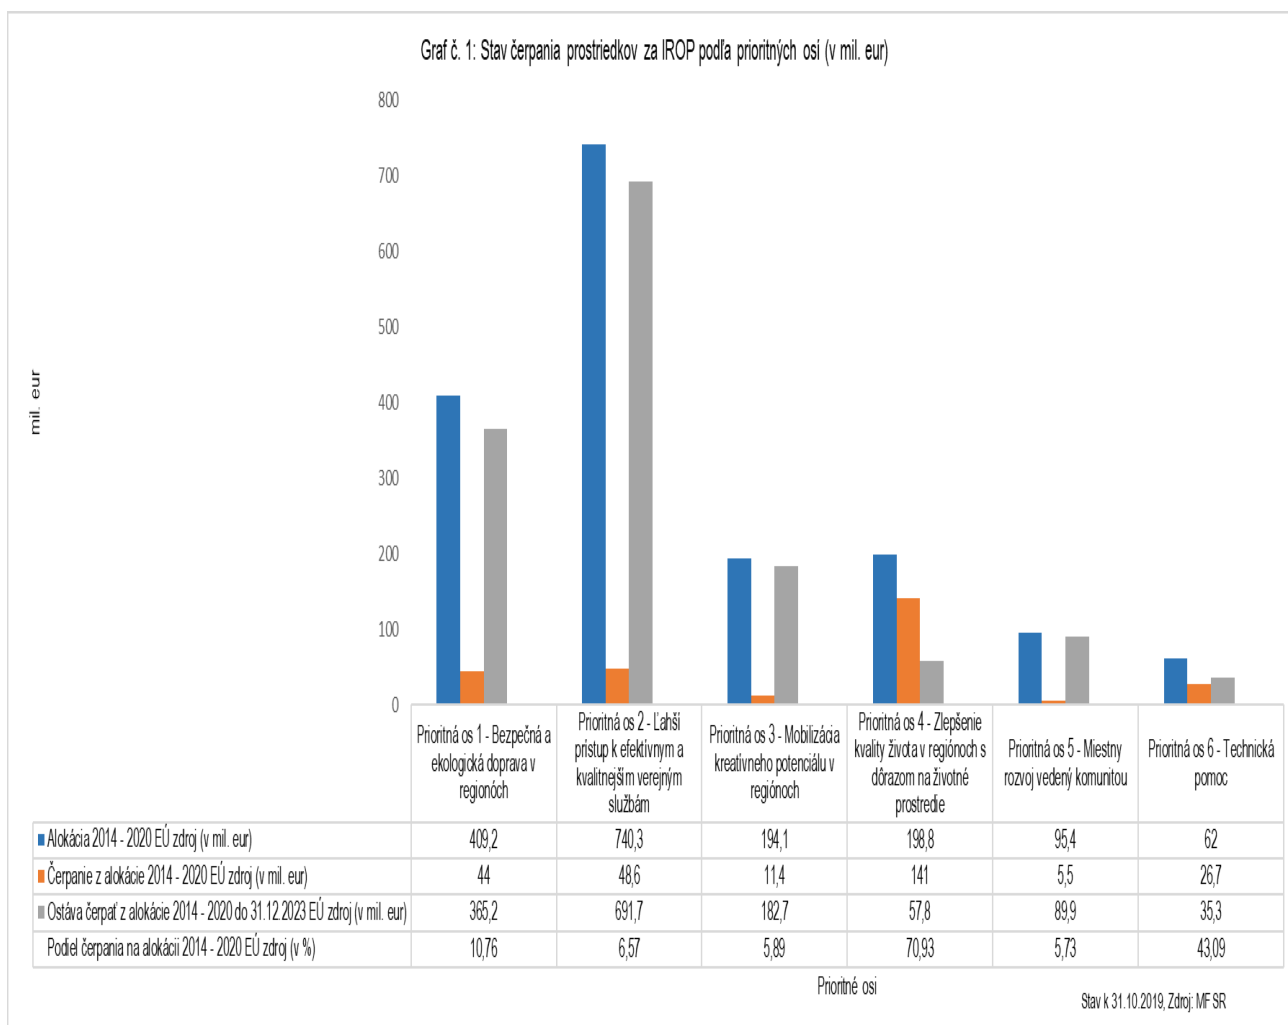

3.2 MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR


Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, vypracovalo metodiku a právny dokument (v súlade so znením zmluvy o poskytnutí NFP) pre overovanie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré musí prijímateľ plniť počas jednotlivých fáz projektu.

Uvedený dokument hodnotia kontrolóri NKÚ SR ako príklad dobrej praxe. Jeho prínos možno vnímať v kontexte **zvýšenia prehľadnosti a jednotnosti postupov a procesov tak na strane prijímateľa, ako aj sprostredkovateľského orgánu**, a zároveň ako **významný prevenčný krok pre zníženie chybovosti** v jednotlivých fázach projektu.

Preverené projekty prijímateľov príspevku v rámci ministerstva hospodárstva boli zamerané na malé a stredné podniky, konkrétne na posilnenie ich konkurencieschopnosti, zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne a automatizáciu. Kontrola na overenej vzorke projektov neidentifikovala nedostatky týkajúce sa nesprávnych hodnôt merateľných ukazovateľov.

U jedného z prijímateľov príspevku zistili kontrolóri porušenie podmienok poskytnutia príspevku tým, že sa počas udržateľnosti projektu stal daňovým dlžníkom a dlhy mal aj v zdravotnom a sociálnom poistení. Postup na riešenie takýchto situácií má sprostredkovateľský orgán stanovený vo vyššie uvedenej metodike.

Celkový objem prostriedkov za dve prioritné osi Operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú plne v zodpovednosti ministerstva hospodárstva, predstavuje sumu vyššiu než 401 miliónov eur. Ku koncu októbra 2019 bolo z tejto sumy vyčerpaných viac ako 78 miliónov eur, čo predstavuje takmer 20 percent. Do konca roka 2023 z celkovej alokácie ostáva vyčerpať bezmála 323 miliónov eur (graf č. 2).

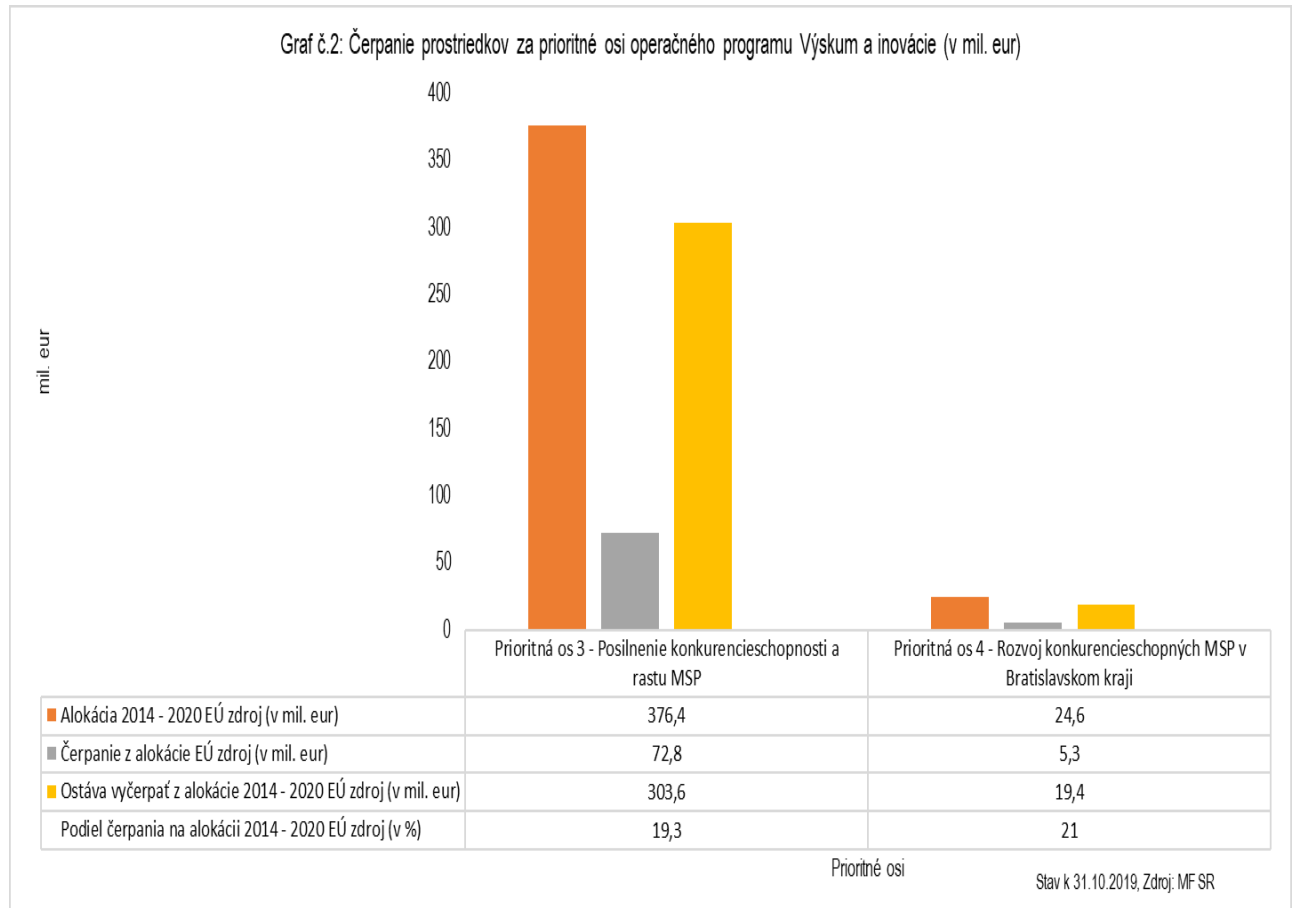

3.3 RIZIKÁ V PROCESE MONITOROVANIA A KONTROLY PROJEKTOV

U obidvoch kontrolovaných ministerstiev, pôdohospodárstva aj hospodárstva, zistili kontrolóri NKÚ SR prípady nedodržania lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii, najmä čo sa týka výkonu kontroly verejného obstarávania. Dlhé lehoty v rezorte hospodárstva sa týkali aj finančnej kontroly na mieste od jej vykonania po spracovanie správy z kontroly.

Nedodžiavanie lehôt zo strany riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu spomaľuje realizáciu projektov a tým aj čerpanie finančných prostriedkov. Zvyšuje sa pritom riziko nesplnenia pravidla „n+3“ a ich následné prepadnutie, takzvaný dekomitment.

Pravidlo „n+3“ určuje, že záväzok musí byť vyčerpaný do troch rokov od jeho prijatia. Podľa tohto pravidla prepadli na konci roka 2018 finančné prostriedky za nedočerpaný záväzok roku 2015 a to za operačný program Val v celkovej sume 81,4 milióna eur a za IROP 38,8 milióna eur. Za operačný program Val prepadlo aj za nedočerpaný záväzok roku 2014 26,9 milióna eur. Dekomitment za OP Val sa netýkal prioritných osí 3 a 4, ktoré sú výhradne v zodpovednosti MH SR. Z dôvodu eliminácie rizika nedočerpania záväzku roku 2016 v OP Val došlo dňom 13. 12. 2019 k zlúčeniu OP Val s OP Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektov je nevyhnutné aj pre plnenie výkonnostného rámca a pridelenie výkonnostnej rezervy v súlade s článkom 22 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Výkonnostná rezerva tvorí 6 % zdrojov pridelených EŠIF, ktorá sa stanoví v jednotlivých operačných programoch podľa prioritných osí (okrem osí týkajúcich sa technickej pomoci) a prideluje sa iba programom a prioritám, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele.

Európska komisia v roku 2019 zhodnotila plnenia čiastkových cieľov výkonnostného rámca na základe hodnôt ukazovateľov jednotlivých operačných programov dosiahnutých k 31. 12. 2018. Na základe preskúmania výkonnosti rozhodla o pridelení výkonnostnej rezervy v celkovej hodnote 474,5 mil. eur za zdroj EÚ tým prioritným osiam, ktoré splnili čiastkové ciele. V OP Val v rámci prioritných osí zameraných na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov, ktoré v rozsahu celej alokácie riadi sprostredkovateľský orgán MH SR, bola výkonnostná rezerva pridelená v plnej sume 25,4 mil. eur. V IROP bola pridelená rezerva len v rámci prioritnej osi zameranej na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie (prioritná os 4) v plnej sume 12,6 mil. eur a v prioritnej osi zameranej na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch v prípade rozvinutého regiónu v plnej sume 1,3 mil. eur. Do prioritnej osi 4 bola v súlade s poslednou revíziou IROP zároveň presunutá výkonnostná rezerva v celkovej sume 92,7 mil. eur z ostatných prioritných osí IROP, v rámci ktorých neboli naplnené čiastkové ciele výkonnostného rámca.

Celkovo kontrolóri NKÚ SR zaznamenali v rámci kontrolnej akcie v šiestnástich kontrolovaných subjektoch 27 zistení. V prípade siedmich kontrolovaných prijímateľov príspevku v rezorte hospodárstva boli zistené nedostatky len u jedného prijímateľa pre nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku v čase udržateľnosti projektu. V rezorte pôdohospodárstva boli zistené nedostatky u všetkých siedmich prijímateľov.

ODPORÚČANIE NKÚ SR PRE MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

V nadväznosti na vývoj operačného programu Výskum a inovácie a postupné ukončovanie projektov – zamerať dohľad riadiaceho orgánu nad sprostredkovateľským orgánom, vnútornú kontrolu aj na overovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektov

ODPORÚČANIA NKÚ SR PRE MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

1. V rámci zistenej dobrej praxe vypracovať právny dokument, ktorý by jasne definoval spôsob overenia podmienok poskytnutia príspevku vo fáze realizácie a udržateľnosti projektu a postup v prípade porušenia či pripustenia možnosti prerušenia plnenia vybraných podmienok.
2. Zamerať činnosť Útvary vnútorného auditu aj na Integrovaný regionálny operačný program.
3. Zvýšiť dohľad ministerstva ako riadiaceho orgánu nad sprostredkovateľskými orgánmi a zamerať kontrolu aj na overovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektov.

4 REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

Kontrolované subjekty neuplatnili námietky voči pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení uvedených v protokoloch o výsledku kontroly. Súčasne sa zaviazali prijať na odstránenie zistených nedostatkov opatrenia a následne zašlú správu o ich splnení, resp. plnení. Plnenie prijatých opatrení bude NKÚ SR v rámci svojej činnosti monitorovať.

5 TÍM KONTROLÓROV

Kontrolnú akciu vykonali štyria kontrolóri NKÚ SR, pracujúci na odbore kontroly I., oddelení európskych fondov; z toho traja s dlhoročnou odbornou praxou.

ZÁVER

Kontrola NKÚ SR sa sústredila na preverenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektov v rámci monitorovania a výkonu kontroly projektov v programovom období 2014 – 2020.

Kontrola splnila svoj účel, jej výsledky môžu pomôcť zlepšiť systém kontroly a monitorovania mnohých neukončených projektov. Zistenia kontroly sú tak významným prevenčným prvkom. Prínosom je aj identifikovaná dobrá prax na Ministerstve hospodárstva SR, ktorá môže byť príkladom aj pre ostatné riadiace a sprostredkovateľské orgány v rámci EŠIF.

Systémovo kontrola nadviazala na viaceré kontroly vybraných operačných programov v predchádzajúcich obdobiach. Kontrolóri pri nich upozornili na nedostatky týkajúce sa nenaplnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov, ktoré

riadiace a sprostredkovateľské orgány neodhalili. Tiež na nedostatočnú účinnosť kontroly na mieste a na nedostatky v monitorovaní realizovaných projektov.

V roku 2017 kontroloval NKÚ SR financovanie škôl a školských zariadení v rámci Regionálneho operačného programu za programové obdobie 2007 – 2013, pričom už pri tejto kontrole upozornili kontrolóri na nejednoznačnú metodiku výpočtu merateľných ukazovateľov v projektoch na zníženie energetickej náročnosti budov či na uvádzanie nesprávnych údajov o merateľných ukazovateľoch v monitorovacích správach projektov.

NKÚ SR zašle záverečnú správu z kontroly monitorovania a výkonu kontroly projektov v programovom období 2014 – 2020 vláde Slovenskej republiky, Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre európske záležitosti.

KONTAKT

Najvyšší kontrolný úrad SR

Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
☎ 02/501 14 911
✉ info@nku.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
☎ 02/485 41 111
✉ info@economy.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
☎ 02/592 66 111
✉ info@land.gov.sk

PRÍLOHA

Príloha č. 1: Projekty a prijímatelia IROP a OP Val

Výber vzorky projektov IROP

Názov projektu	Prijímateľ
Revitalizácia MŠ Skalica – pracovisko: Pod kalváriou	Mesto Skalica
Zvýšenie kapacity MŠ Boleráz nadstavbou	Obec Boleráz
Rekonštrukcia MŠ Fedákova	Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Prístavba a nadstavba objektu ZŠ Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby MŠ	Mestská časť Bratislava – Vajnory
MŠ Šelpice formou modulov	Obec Šelpice
Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany	Obec Kopčany
Rekonštrukcia budovy MŠ Horné Orešany – prístavba	Obec Horné Orešany

Výber vzorky projektov OP Val

Názov projektu	Prijímateľ
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti GERI door, s.r.o.	GERI door, s.r.o.
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne spoločnosti STOFINGSTAV, s.r.o.	STOFINGSTAV, s.r.o.
Automatizácia sladových síl	LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VALEUR, s.r.o., inováciou polygrafickej činnosti	VALEUR, s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie pre firmu A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.	A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie v GASTRO – HAAL, s.r.o.	GASTRO – HAAL, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti IN DESIGN, s.r.o.	Bóna LABELS, s.r.o.
